

STATUSBERICHT
ROLLOUT UMVERTEILUNG
PIK-SYSTEME

21. März 2018



Bundesdruckerei GmbH · Kommandantenstraße 18 · D-10969 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 - 25 98 - 0 · Fax: +49 (0) 30 - 25 98 - 22 05
www.bundesdruckerei.de

Copyright © Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Ziel / Vorhaben:

Gemäß CR-13 sollen die Ausländerbehörden (ABHen) mit Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) ausgestattet werden.


Die Ausländerbehörden sollen in die Lage versetzt werden, die PIK einzusetzen, so dass diese die Registrierungen mit Fingerabdrücken vornehmen können, um schnellstmöglich eine gesetzeskonforme Erstregistrierung nach § 16 Abs. 1 AsylG und mittelfristig nach § 49 Abs. 8 und 9 AufenthG sowie eine gesetzeskonforme Übermittlung der Fingerabdruckdaten und der dazugehörigen Referenznummern an das Kerndatensystem nach § 3 AZRG zu ermöglichen.

Ziel ist es, die ABHen im Wesentlichen durch eine Umverteilung der in dem BAMF und in den Landesbehörden bereits vorhandenen PIK auszustatten.

Die initiale Ausstattung der Ausländerbehörden erfolgt genau mit einer PIK-Lösung.

Dabei soll primär eine Software-PIK zum Einsatz kommen, die auf dem Arbeitsplatzrechner der Behörde installiert und um entsprechende Peripheriegeräte ergänzt wird. Sollte die PIK-Software nicht lauffähig sein, würde alternativ eine komplette PIK eingesetzt werden.

Bundesland	Anzahl Behörden	Behörden mit Rollout-Typ		Übersicht Rollout-Status		
		Anzahl mit Laptop	Anzahl ohne Laptop	Anzahl Behörden mit Rückmeldung	Anzahl Behörden mit Rollout-/Inbetriebnahme Termin	Anzahl Behörden in Betrieb genommen
Baden-Württemberg	131	53	78	43	12	1
Bayern	104	39	65	46	14	6
Brandenburg	16	7	9	12	11	4
Bremen	2	0	2	0	0	0
Mecklenburg-Vorpommern	11	2	9	2	1	1
Niedersachsen	46	21	25	21	21	13
Nordrhein-Westfalen	82	34	48	32	11	2
Rheinland-Pfalz	36	12	24	14	1	0
Sachsen	13	5	8	7	2	0
Sachsen-Anhalt	14	7	7	11	7	3
Schleswig-Holstein	15	2	13	5	2	1
Thüringen	23	10	13	13	9	3
Gesamt	493	192	301	206	91	34

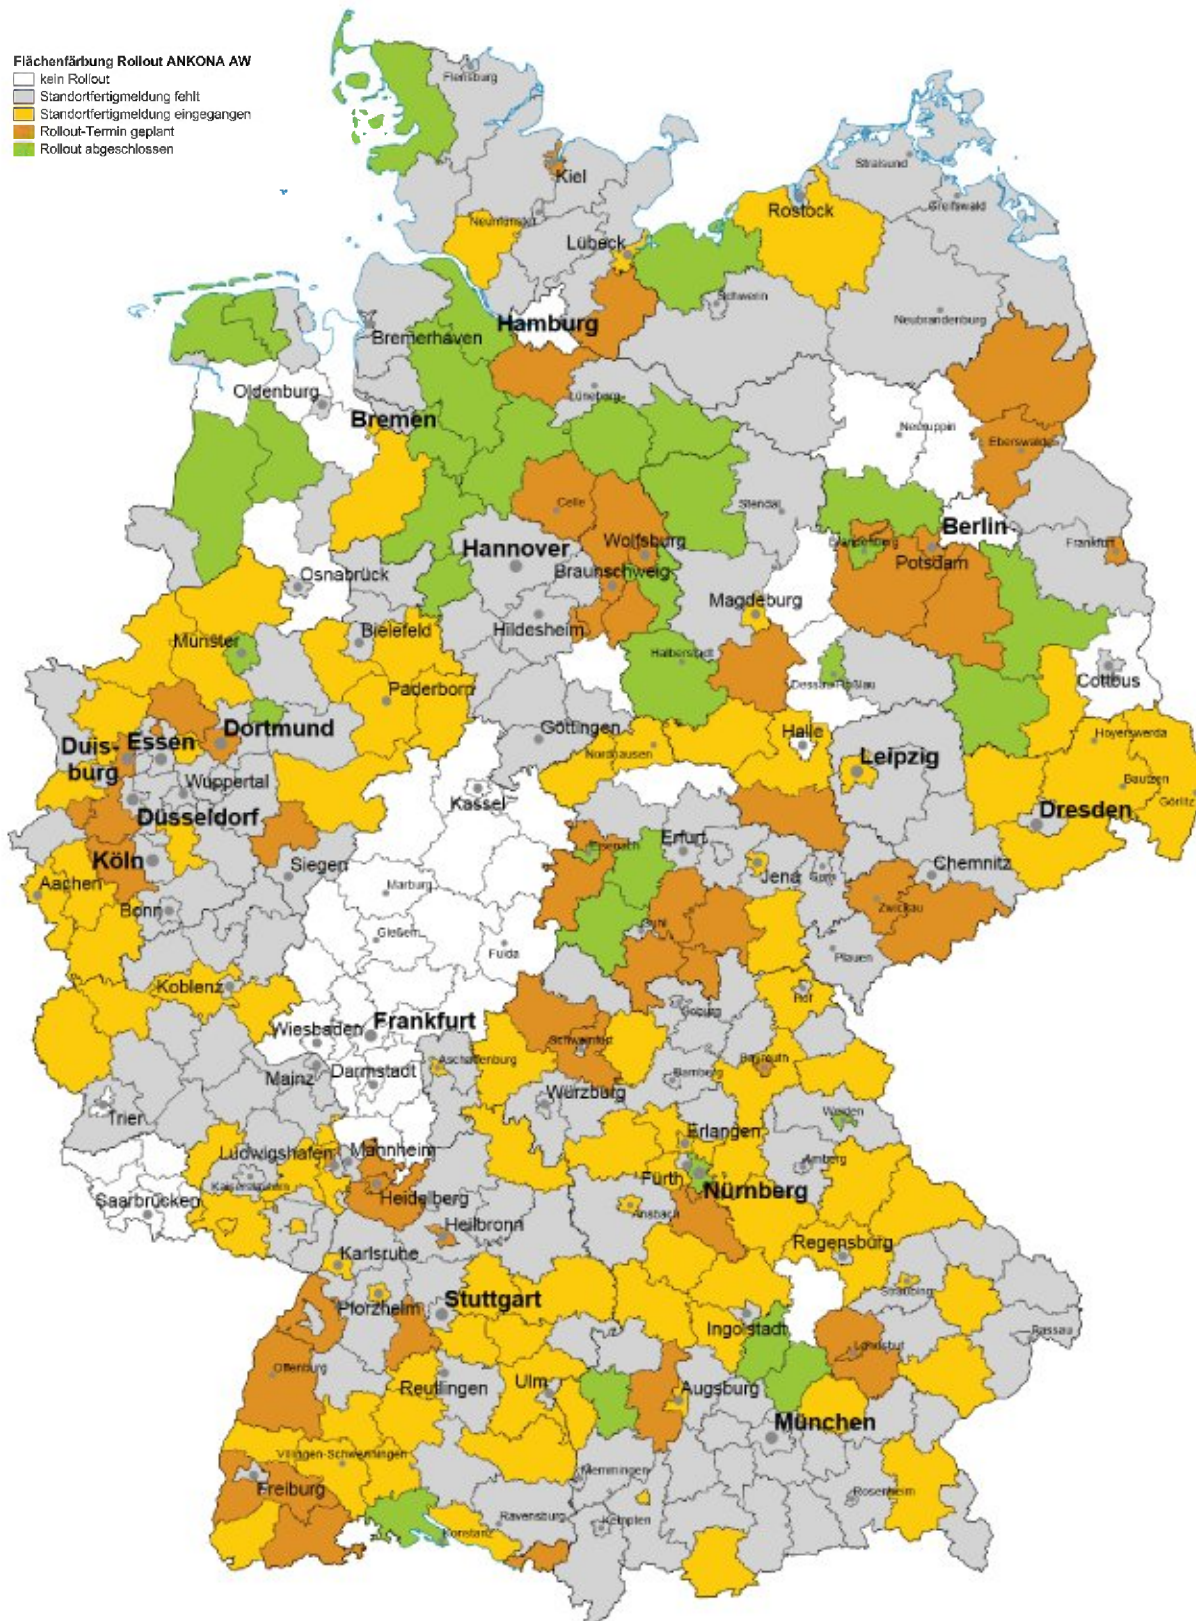

Rollout - Umverteilung PIK-Systeme in die Ausländerbehörden

	Dez				Jan				Feb				Mär				Apr			
Abholung der PIK aus BAMF																				
Abholung der PIK aus Länder																				
Neu-Zusammenstellung der PIK-Koffer																				
Vorbereitende Maßnahmen zum Rollout (Beschaffung der Hardware, Logistik, Koordination)																				
Rollout der Software-PIK bzw. Komplett-PIK																				
